

Sandaufspülung Südküste Föhr 2026 Nieblum (Strand) und Goting-Kliff

Husum, den 14.08.2026

10. Baubericht


Aufspülmengen bis einschließlich 13. August 2026:

Aufspülbereich	Station	geplant	aktuell	Status
Nieblum (Strand)	2+400 bis 4+203	240.000m ³	252.153m ³	fertiggestellt
Goting-Kliff	4+203 bis 5+359	205.000m ³	178.500m ³	aktiv
Gesamtmenge		445.000m³	430.653m³	

Stand:

Das Baggerschiff „Embla R“ versorgen weiterhin den Aufspülabschnitt Goting-Kliff in Richtung Westen mit Sand. Das Spülfeld befindet sich aktuell auf Höhe des roten Pfeils.

Die gesamten Aufspülarbeiten werden voraussichtlich Ende August abgeschlossen sein.

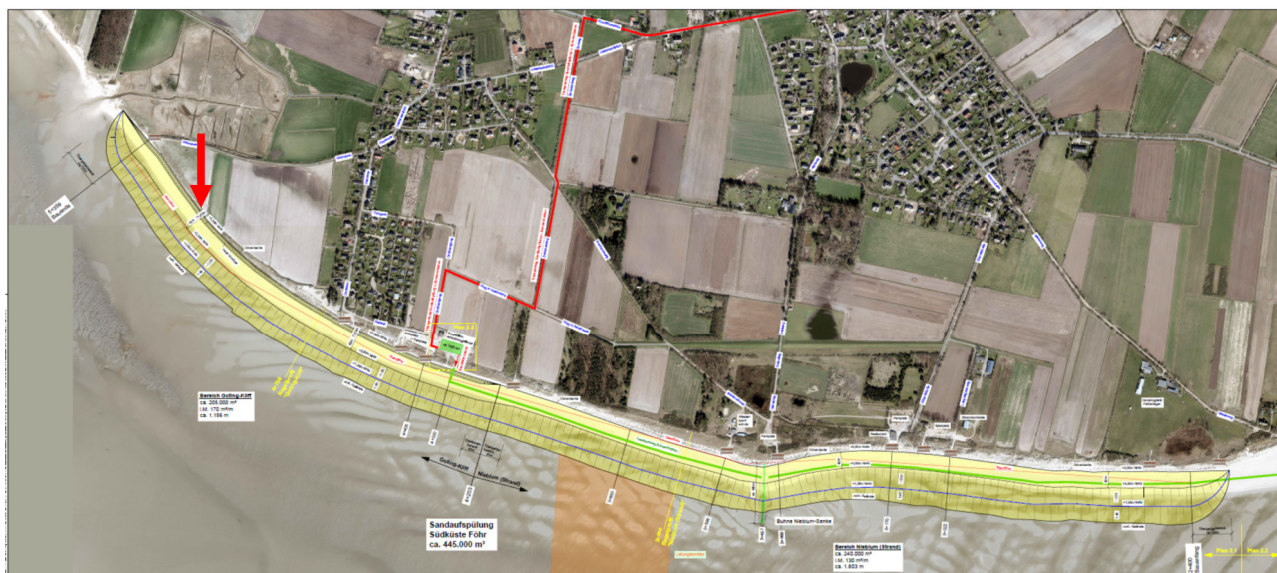

Die o. g. Termine sind erfahrungsgemäß vorläufige Daten, die sich z. B. wetterbedingt oder durch den Ausfall der Baggerschiffe verschieben können.

Mit freundlichem Gruß
Ole Martens
