

Sandaufspülung Südküste Föhr 2026 Nieblum (Strand) und Goting-Kliff

Husum, den 21.08.2026

11. Baubericht


Aufspülmengen bis einschließlich 20. August 2026:

Aufspülbereich	Station	geplant	aktuell	Status
Nieblum (Strand)	2+400 bis 4+203	240.000m ³	252.153m ³	fertiggestellt
Goting-Kliff	4+203 bis 5+359	205.000m ³	180.500m ³	aktiv
Gesamtmenge		445.000m³	432.653m³	

Stand:

Aufgrund von technischem Schiffsausfall kam es in der vergangenen Woche zu einer Aufspülunterbrechung. Um den Strandabschnitt Goting-Kliff dennoch termingerecht fertigstellen zu können wird das Baggerschiff „Embla R“ seit gestern durch das Schwesterschiff „Ask R“ unterstützt. Beide versorgen den Aufspülabschnitt Goting-Kliff in Richtung Westen täglich mit ca. 8.000m³ Sand. Das Spülfeld befindet sich aktuell auf Höhe des roten Pfeils.

Die gesamten Aufspülarbeiten werden voraussichtlich Ende August abgeschlossen sein.

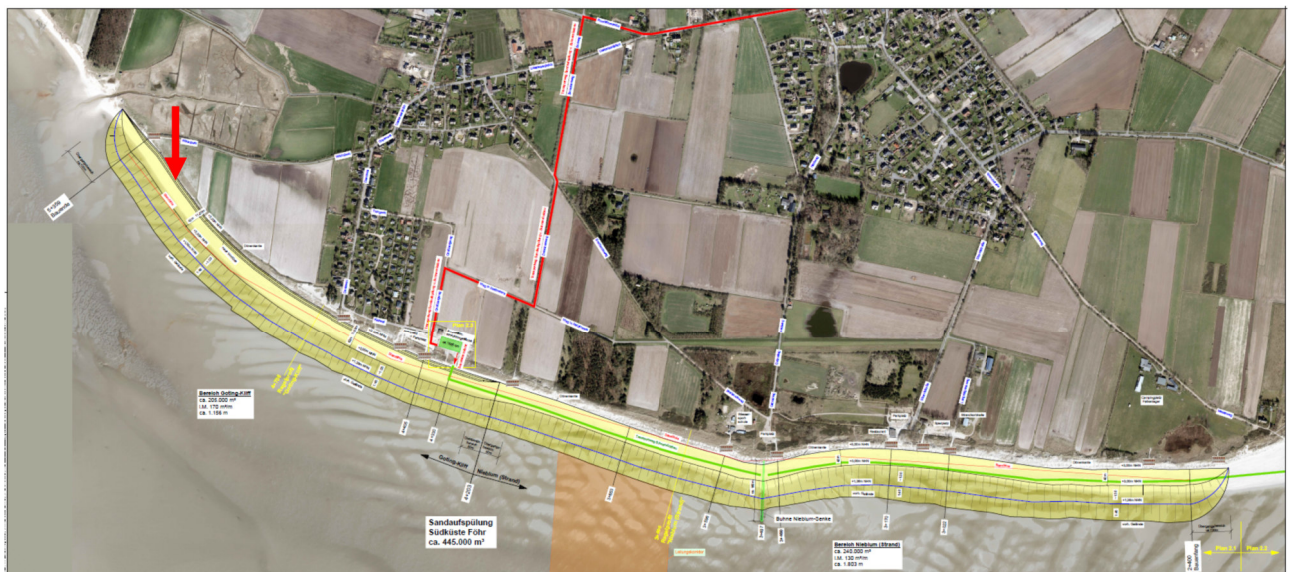

Die o. g. Termine sind erfahrungsgemäß vorläufige Daten, die sich z. B. wetterbedingt oder durch den Ausfall der Baggerschiffe verschieben können.

Mit freundlichem Gruß
Ole Martens
