

Sandaufspülung Südküste Föhr 2026 Nieblum (Strand) und Goting-Kliff

Husum, den 03.07.2026

7. Baubericht

Aufspülmengen bis einschließlich 1. Juli 2026:


Aufspülbereich	Station	geplant	aktuell	Status
Nieblum (Strand)	2+400 bis 4+203	240.000m ³	233.613m ³	aktiv
Goting-Kliff	4+203 bis 5+359	205.000m ³	0m ³	nicht begonnen
Gesamtmenge		445.000m³	233.613m³	

Stand:

Die Baggerschiffe „Ask R“ und „Embla R“ versorgen weiterhin den Aufspülabschnitt Nieblum (Strand) mit Sand. Am 27.06.2026 ist das östliche Ende des Aufspülabschnitts Nieblum (Strand) erreicht worden. Die Spülrohrleitung auf dem Strand wurde zurückgebaut, der Strand noch einmal nachprofiliert und anschließend mit den Sandaufspülarbeiten, ausgehend von ca. der Mitte des Gesamt-Aufspülabschnitts, in Richtung Westen begonnen. Von hier bis zum Aufspülabschnitt Goting-Kliff sind noch ca. 350m des Aufspülabschnitts Nieblum (Strand) mit Sand zu versorgen. Das Spülfeld befindet sich derzeit ca. 50m östlich (roter Pfeil) vom Abschnittwechsel.

Aufgrund der Wetterlage erfolgen aktuell keine Aufspülarbeiten.

Die gesamten Aufspülarbeiten werden spätestens Ende August fertiggestellt sein.

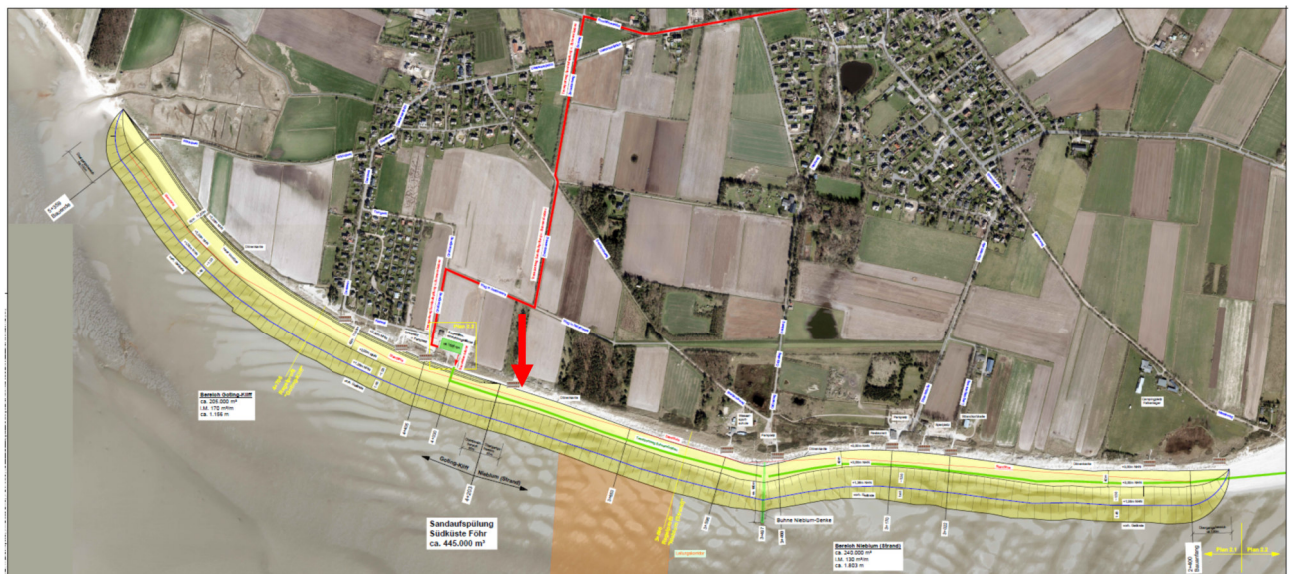

Die o. g. Termine sind erfahrungsgemäß vorläufige Daten, die sich z. B. wetterbedingt oder durch den Ausfall der Baggerschiffe verschieben können.

Mit freundlichem Gruß
Ole Martens
