

Sandaufspülung Südküste Föhr 2026 Nieblum (Strand) und Goting-Kliff

Husum, den 17.07.2026

8. Baubericht


Aufspülmengen bis einschließlich 16. Juli 2026:

Aufspülbereich	Station	geplant	aktuell	Status
Nieblum (Strand)	2+400 bis 4+203	240.000m ³	252.153m ³	fertiggestellt
Goting-Kliff	4+203 bis 5+359	205.000m ³	50.590m ³	aktiv
Gesamtmenge		445.000m³	302.743m³	

Stand:

Die beiden Baggerschiffe „Ask R“ und „Embla R“ versorgen aktuell den Aufspülabschnitt Goting-Kliff mit Sand. Zu Beginn der kommenden Woche wird das Baggerschiff „Ask R“ die Gewässer vor Föhr verlassen, um einen anderen Auftrag auszuführen. Die „Embla R“ wird die Sandaufspülung auf Föhr fertigstellen. Am 06.07.2026 ist das westliche Ende des Aufspülbereichs Nieblum (Strand) erreicht worden. Damit ist dieser Abschnitt fertiggestellt. Direkt anschließend ist mit den Aufspülarbeiten im Aufspülbereich Goting-Kliff begonnen worden. Aktuell befindet sich das Spülfeld auf Höhe des Strandparkplatzes von Goting (roter Pfeil).

Die gesamten Aufspülarbeiten werden spätestens Ende August fertiggestellt sein.

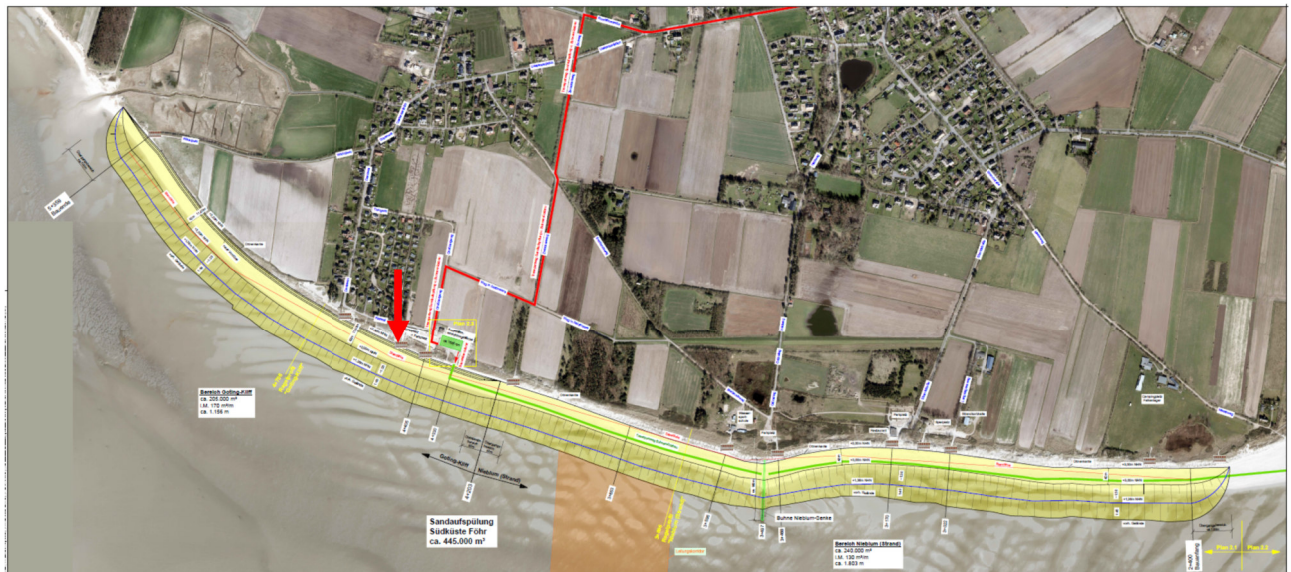

Die o. g. Termine sind erfahrungsgemäß vorläufige Daten, die sich z. B. wetterbedingt oder durch den Ausfall der Baggerschiffe verschieben können.

Mit freundlichem Gruß
Ole Martens
